STRABAG

Direktion Direktion
Bereich Bereich

- LVHQ - Filsener Straße Osterspai -
- Ortsgemeinde Osterspai -

Bauzeitenplan

Ansicht: BHV Adr. 3
Druckdatum: 25.01.2024
Kostenstelle: KST

Nr.	Bezeichnung	Start	Ende	Dauer
1	**Ausbau Filsinger Straße - Osterspai**	**04.03.2024**	**30.08.2024**	**124,00t**
2	Baubeginn	04.03.2024	04.03.2024	
3	Baustelle einrichten, Verkehrssicherung aufstellen	04.03.2024	05.03.2024	2,00t
4	Asphaltfläche fräsen	06.03.2024	06.03.2024	1,00t
5	Suchschachtungen herstellen -> Ortung Lage Kabel/Leitungen und ggf. Nachbeprobung Bodenmaterial	07.03.2024	07.03.2024	1,00t
6	Probefelder herstellen	07.03.2024	07.03.2024	1,00t
7	Rückbau Oberflächenbefestigung	08.03.2024	21.03.2024	10,00t
8	Erdaushub Straße	22.03.2024	15.04.2024	15,00t
9	Bodenaustausch herstellen (falls erforderlich)	16.04.2024	29.04.2024	10,00t
10	Drainage herstellen	30.04.2024	07.05.2024	5,00t
11	Einbau 1. Lage FSS (Schutz Erdplanum)	08.05.2024	15.05.2024	5,00t
12	Erdarbeiten Straßenbeleuchtung	16.05.2024	23.05.2024	5,00t
13	Straßenabläufe herstellen + Anpassung Schächte	24.05.2024	14.06.2024	15,00t
14	Bordanlage + Rinnen	17.06.2024	05.07.2024	15,00t
15	Pflasterflächen Gehwege herstellen	08.07.2024	26.07.2024	15,00t
16	Einbau Rest FSS + Feinplanum	29.07.2024	02.08.2024	5,00t
17	Einbau Asphalt	05.08.2024	07.08.2024	3,00t
18	Angleichung Hofeinfahrten + Randarbeiten (Oberboden)	08.08.2024	28.08.2024	15,00t
19	Restarbeiten, Baustelle räumen, Verkehrssicherung abbauen	29.08.2024	30.08.2024	2,00t
20	Bauende	30.08.2024	30.08.2024	

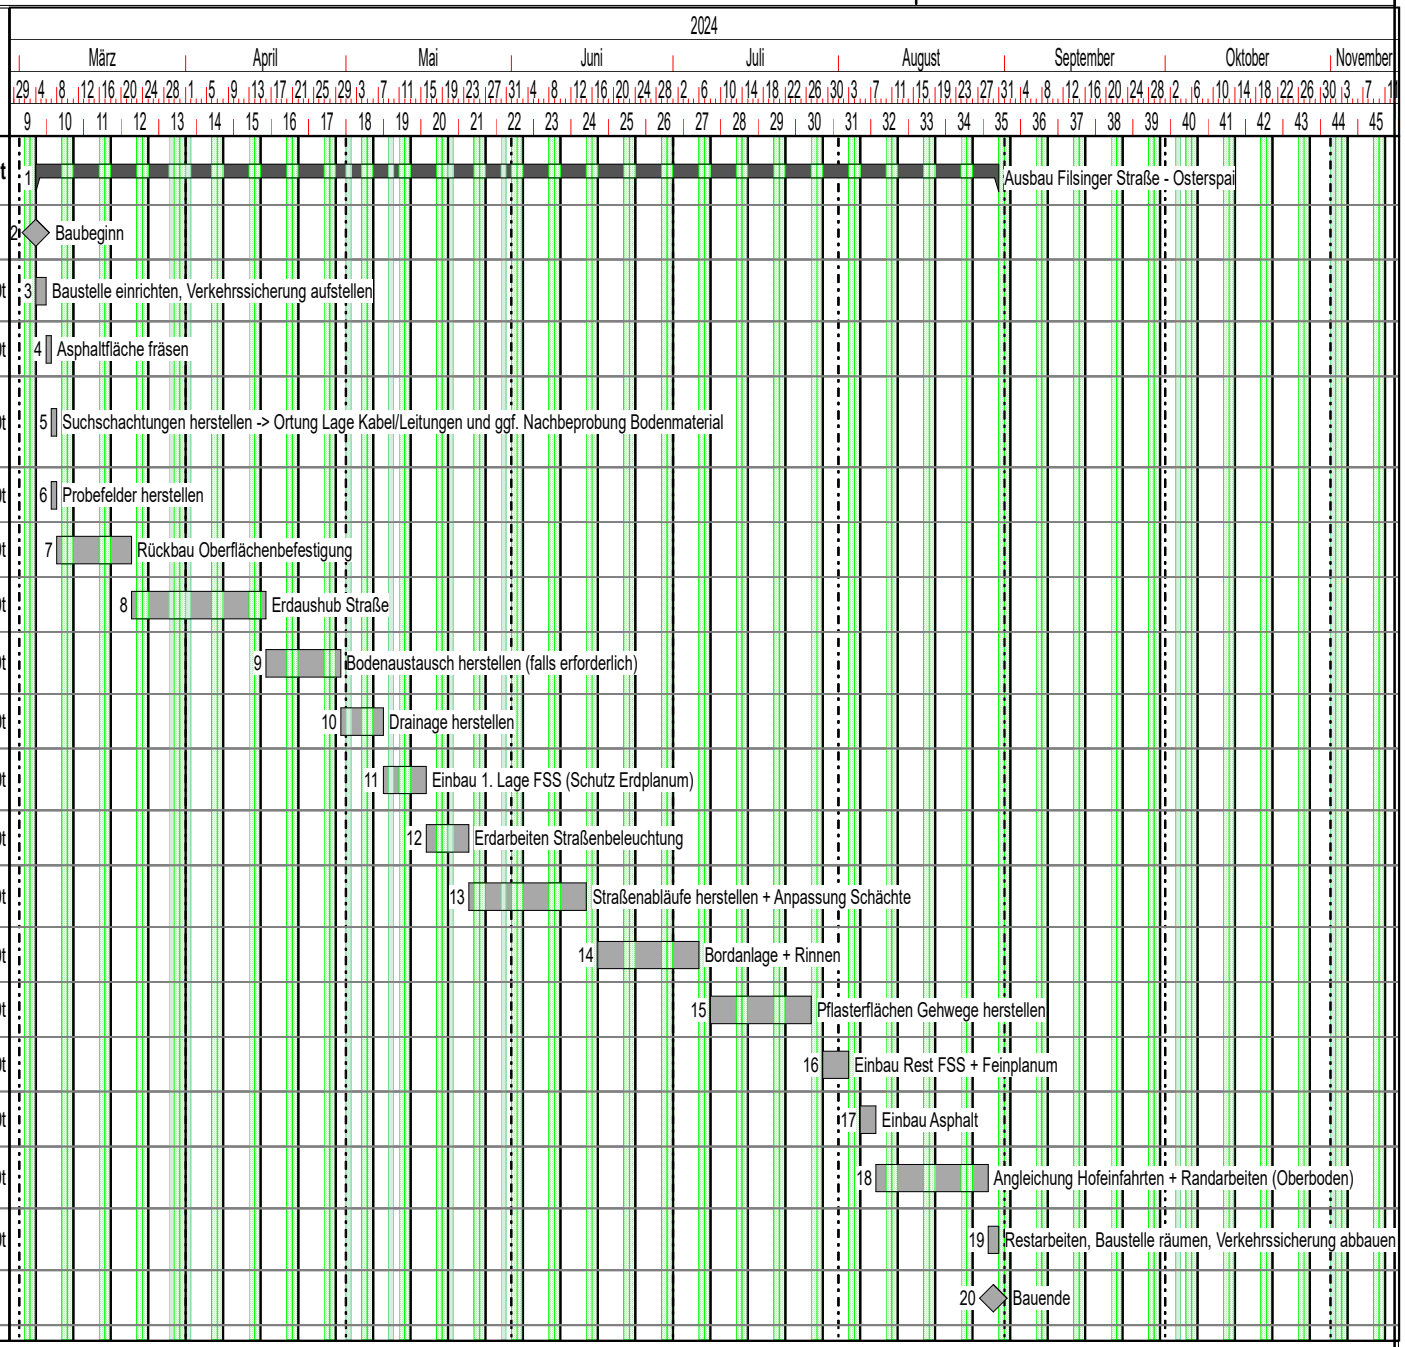

Meilenstein Formen

◇ Raute
